PROCESSOS DE SOFTWARE · TURMA T02· SPRINT 1

Suricato

Sistema web de **mapa colaborativo de ocorrências urbanas** — registre, visualize e gerencie problemas da cidade de forma geolocalizada e em tempo real.

Made with GAMMA

EQUIPE

Quem está por trás do projeto

Kézia Ketillen Santos Lima

Engenheira de Software

Scrum Master

Marcus Aurelius Costa de Paiva

Engenheiro de Software

Product Owner

Tiago Rodrigues dos Santos

Engenheiro de Software

Project Manager

SPRINT 1

Objetivo: Fundação do Projeto

O que foi planejado

8 issues para estabelecer toda a infraestrutura base do Suricato.

- Definição de horários e cerimônias ágeis
- Configuração do PostgreSQL
- Inicialização do Spring Boot
- Boilerplate ReactJS + Tailwind CSS
- Protótipo da home page e visualização do mapa
- Modelo relacional do banco de dados
- Documentação do modelo de dados

Contexto da Sprint

Esta foi a **Sprint 1 — sprint de fundação**. O objetivo foi montar o ambiente completo: banco de dados, back-end, front-end e primeiros artefatos de documentação.

Critério de priorização: fundação técnica primeiro — ambiente antes de features.

Made with GAMMA

PROCESSO ÁGIL

Sprint Planning & Kanban

Como priorizamos?

Issues ordenadas por **dependência técnica**: BD → back-end → front-end → UI. Estimativas definidas em conjunto no planning.

Backlog
Todas as 8 issues mapeadas antes do início.

In Progress
Tarefas em execução com comunicação contínua via WhatsApp.

Done ✅
100% das issues concluídas — nenhuma pendência ou bloqueio.

Made with GAMMA

Kanban

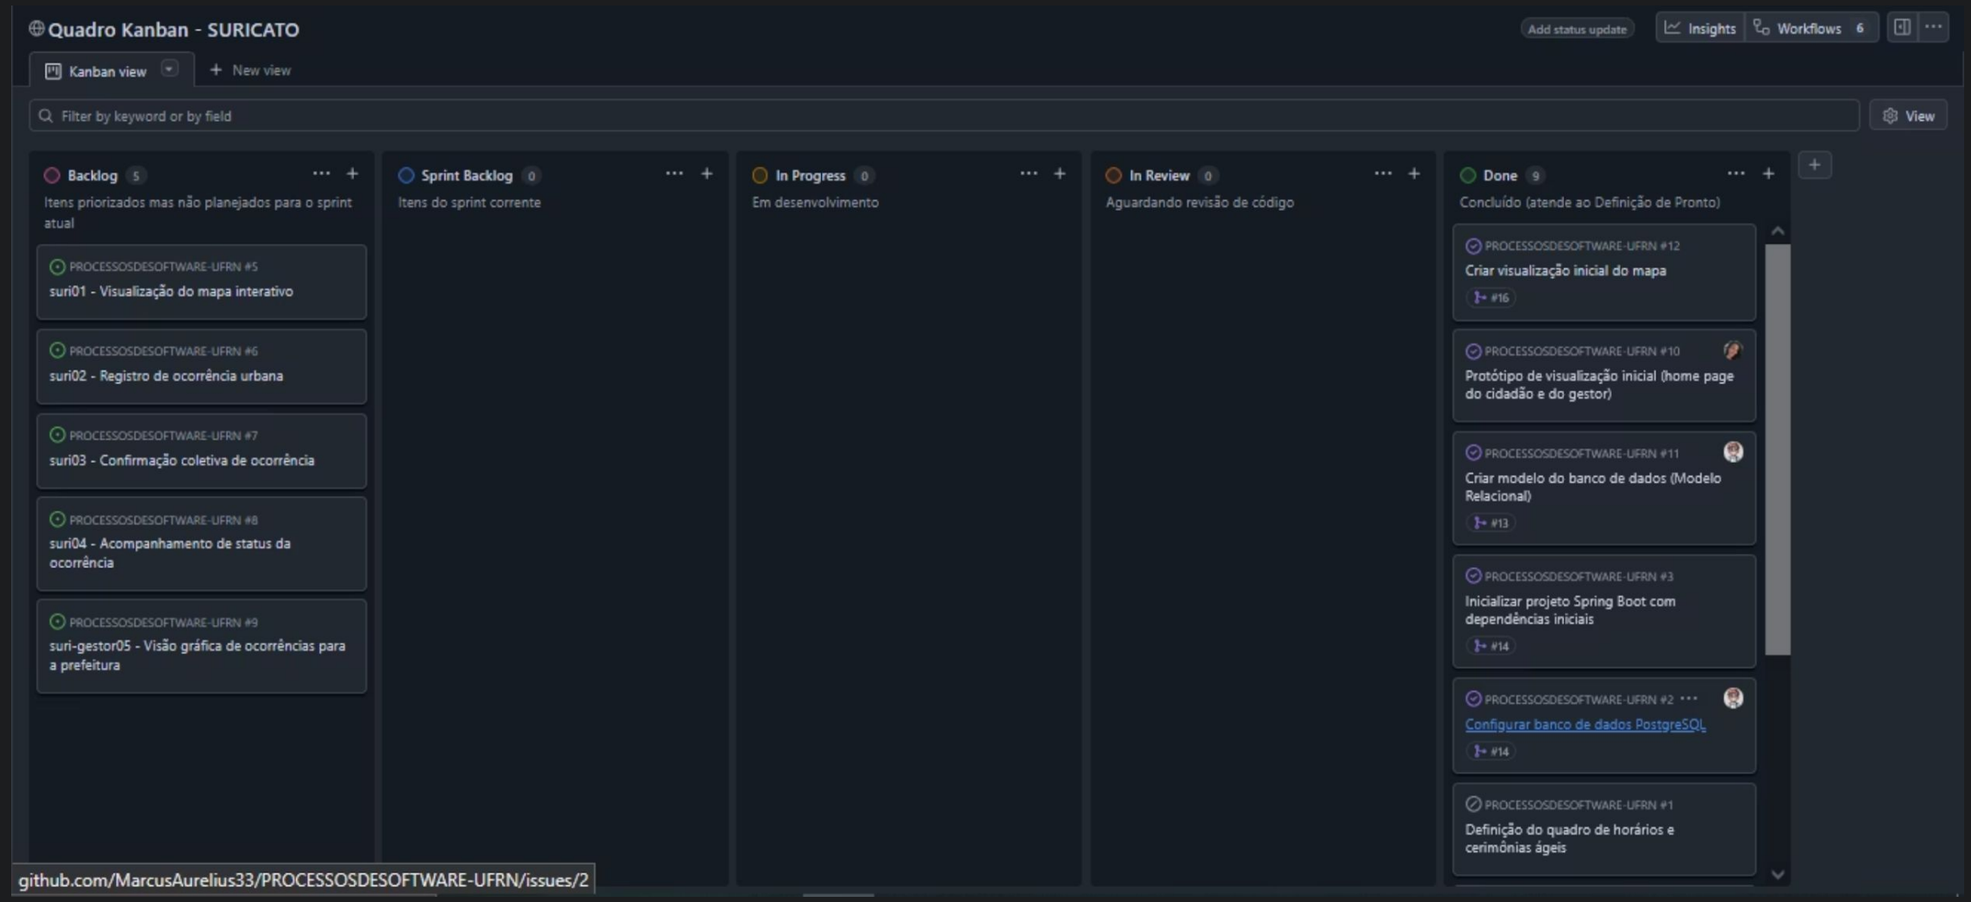

Made with GAMMA

FLUXO DE TRABALHO

Throughput & Revisão de Código

Implementar **Comunicar** **Revisar** **Mergear**

O fluxo foi simples e eficaz: cada entrega disparava uma **revisão cruzada** entre integrantes, garantindo qualidade antes do merge e alinhamento técnico compartilhado pela equipe.

Made with GAMMA

RETROSPECTIVA

O que funcionou bem

Comunicação Ágil

WhatsApp como canal eficiente para avisos e alinhamentos rápidos.

Revisão Cruzada

Todos os merges passaram por revisão de outro integrante.

100% de Entrega

8 de 8 issues concluídas sem bloqueios graves.

Divisão por Dependência

Tarefas distribuídas conforme a ordem técnica de implementação.

Made with GAMMA

RETROSPECTIVA

O que precisa melhorar

Documentação técnica

Registrar melhor as decisões de arquitetura e escolhas técnicas.

Antecipação de dependências

Mapear bloqueios potenciais antes do início da sprint.

Consistência nos commits

Padronizar mensagens de commit seguindo convenção definida.

Ações para a Sprint 2

- Daily assíncrona via WhatsApp (check-in diário)
- Backlog refinement antes do planning

Made with GAMMA

PRÓXIMOS PASSOS

Sprint 2 — Das Features ao Usuário

Com a base pronta, o foco muda para **funcionalidades visíveis** e integração completa entre as camadas do sistema.

1

Funcionalidades Core

Implementação das features principais do Suricato.

2

Integração Full-Stack

Conexão front-end ↔ back-end ↔ banco de dados.

3

Iniciar historia de usúario

Definir e quebrar em subtasks as historias de usúario

4

Testes de Integração

Validação inicial das camadas integradas do sistema.

Made with GAMMA
